



平成23年度

長崎県公共事業評価監視委員会意見書

平成23年6月13日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長 園田 圭介



平成23年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書

1. 意見

諮問があった再評価対象事業の「川棚川河川総合開発事業(石木ダム)」及び「長崎水害緊急ダム事業(浦上ダム)」については、総合的に判断を行い、いずれも対応方針(原案)どおり認めることに決定しましたので答申します。

2. 審議過程における意見等

審議過程において、多くの議論が交わされたことについて留意されたい。

【主な意見等】

川棚川河川総合開発事業(石木ダム)

- ・ 事業着手後長期に亘り用地取得が完了していないという事実を鑑みると、実現性の評価において、現行計画(ダム案)が、今後新たに用地取得が必要となる代替案と比較して勝るとは考えにくい。
- ・ 利水代替案の比較における維持管理費の算出において、1日最大給水量の確保を前提としているが、現実的な前提とは考えにくい。
- ・ 治水計画や利水計画などについて、地権者の理解を得る努力を求める。

長崎水害緊急ダム事業(浦上ダム)

- ・ 約45万立方メートルの貯水池内掘削が必要となるが、土砂搬出時における環境対策など、周辺住民への配慮を求める。

3. 審議経過


- ・ 第1回委員会(平成23年5月25日開催)
- ・ 第2回委員会(平成23年6月6日開催)

平成23年度 再評価対象事業数一覧

担当部	担当課	対象事業数	県事業	市町村事業	備考
水産部					
	漁港漁場課				
農林部					
	農村整備課				
	森林整備室				
環境部					
	水環境対策課				
土木部		2	2		
	都市計画課				
	道路建設課				
	道路維持課				
	港湾課				
	河川課	2	2		
	砂防課				
	住宅課				
合計		2	2		

土木部 事業位置図(再評価)

(別記5)

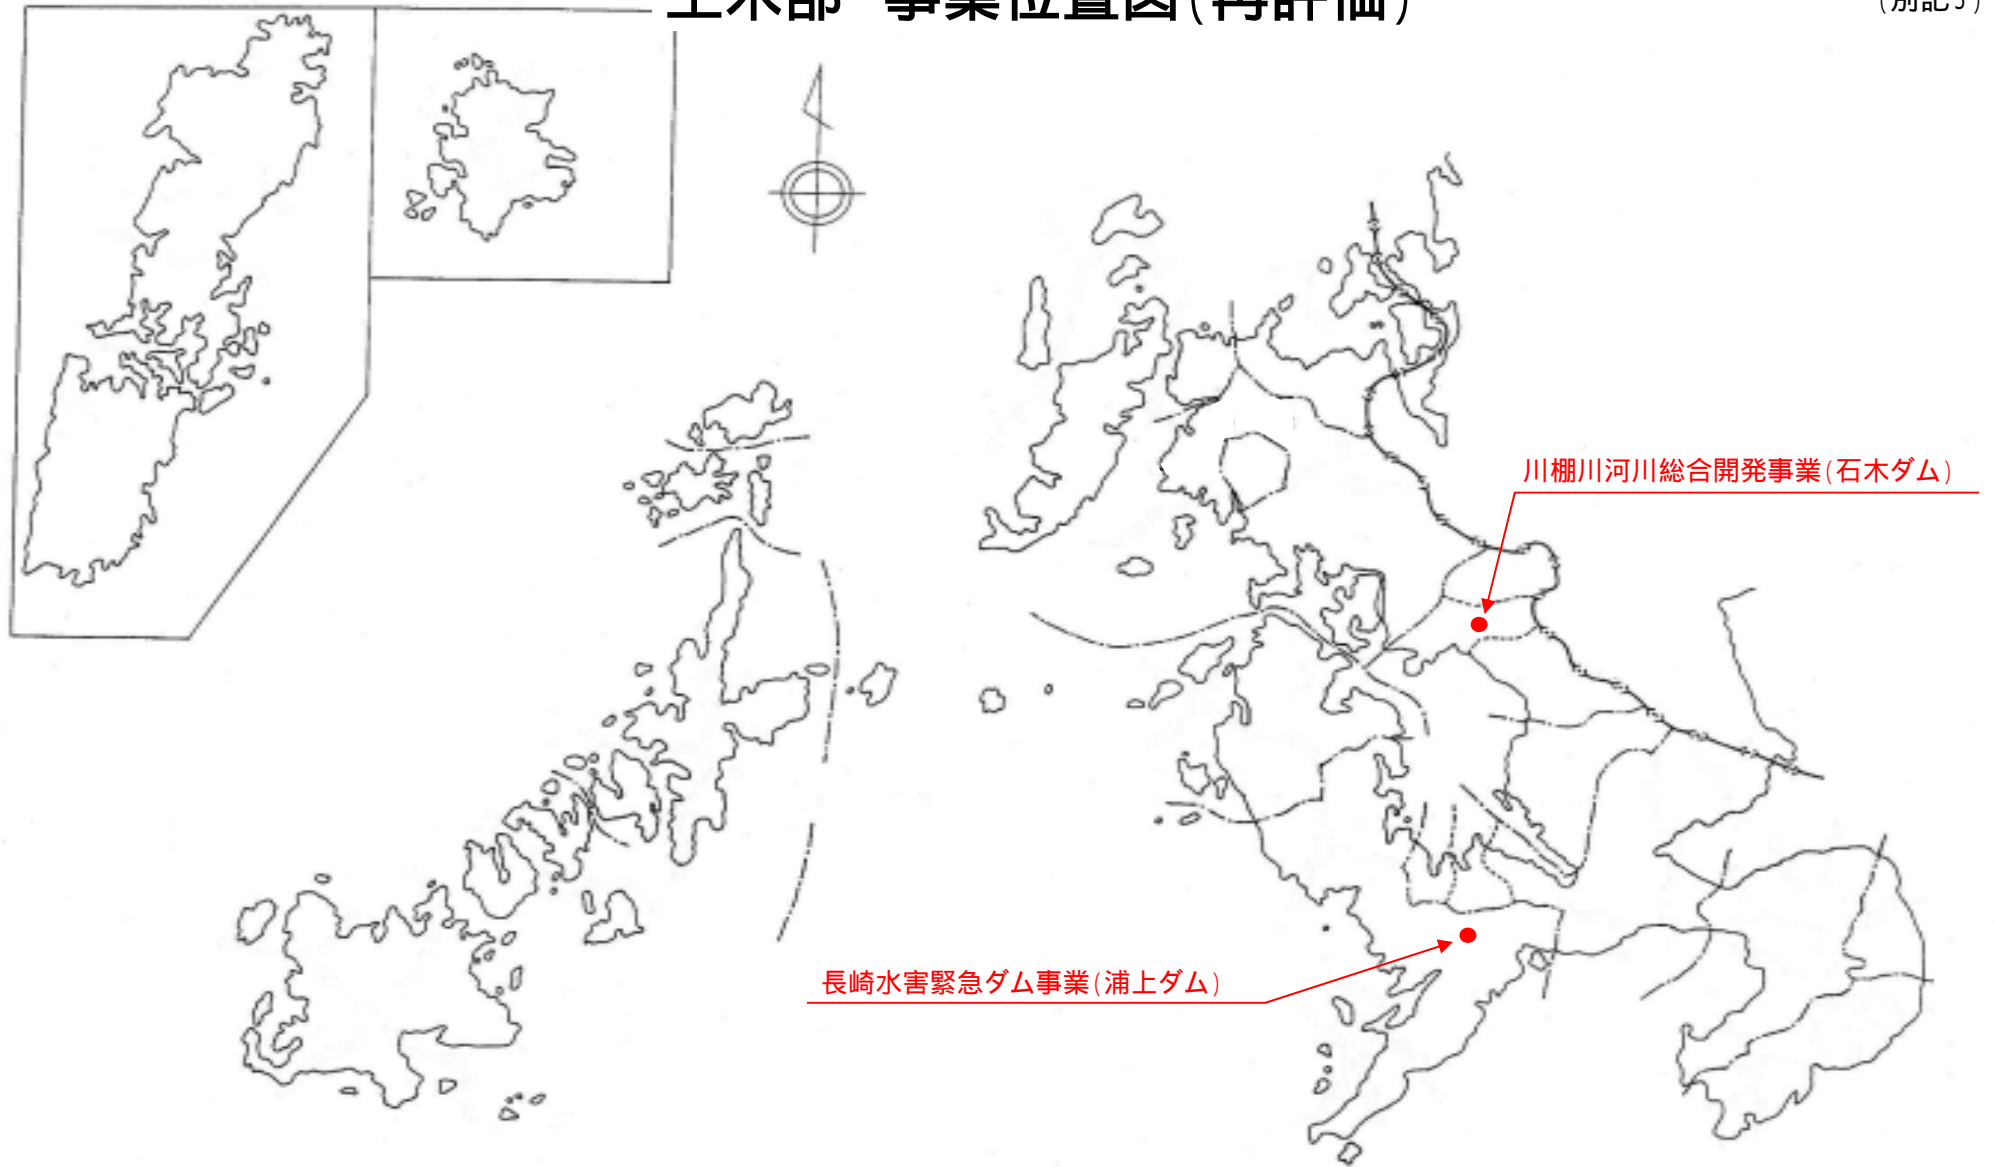

平成23年度 再評価対象事業一覧表

事業計画								再評価の理由	進捗率(%)	前回審議年度	対応方針(原案)
事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)				
					着工	完了					
上段：当初 下段：変更											
川棚川河川総合開発事業	石木ダム	県	川棚町	重力式コンクリートダム ダム高H=55.4m 堤頂長L=234.0m	S48	H28	285.0	社会経済情勢の急激な変化	48.8	H20	継続
					S48	H28	285.0				
長崎水害緊急ダム事業	浦上ダム	県	長崎市	重力式コンクリートダム ダム高H=21.8m(0.8m嵩上) 堤頂長L=95.0m 貯水池掘削 V=451千m3	S58	H28	620.0	社会経済情勢の急激な変化	79.8	H20	継続
					S58	H28	670.0				
